Atento comunicado.

El pasado 22 de mayo de 2023, se quemó el centro de carga general y un interruptor, que se encuentran en la Subestación Eléctrica del Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 77, provocando que las instalaciones del mismo se Notificando quedaran sin suministro de luz. inmediatamnete de manera económica, y mediante el formato der "Nota Informativa" a la Oficina Estatal de la DGETI en Veracruz el 9 de junio. El servicio electrico se comparte con la Escuela Secundaria Tecnica Industrial No. 45. El 25 de mayo se pudo conseguir un centro de carga de 400 Amp usado, que se instaló, y desde ese día se imparten clases sin hacer uso de los aires acondicionados, va que fue la recomendación hasta que no se identificara la causa del corto circuito que provocó el daño a los equipos señalados, las dos instituciones educativas aportaron \$6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100M.N.) cada una, para pagar esta reparación. Ese mismo día 25 de mayo, el Director del CBTis 77, a compañado de Javier Oceguera Medel, Subdirector del CBTis 77 y el profesor Nelson Camacho Rogel, Director de la ESTI No. 45, se presentaron a una cita con la Presidenta Municipal, María Esther Arroniz López, la presidenta propuso que la Compañía Eléctrica que realiza obra en el municipio, "Alta y Baja Tensión Lemmor S.A. de



Recibo del servicio de luz, julio 2023, del CBTis 77

C.V.", realizara una inspección y cotización del daño, por lo que el martes 6 de junio se presentaron en la institución a realizar una inspección. Durante los días 8 y 9 de junio de nueva cuenta se presentaron y realizaron pruebas, para verificar las lineas de energía que llegan a los edificios, así como a la Escuela Secundaria Técnica 45, con quien se comparte. Posteriormente se realizaron diversas cotizaciones con diferentes empresas para el mantenimiento total de la Subestación y así realizarla en el periodo vacacional, para que al regreso a clases las instalaciones estén en completo funcionamiento con el suministro eléctrico.





Informe enviado a la Oficina Estatal de la DGETI




Cotización 1





Cotización 2

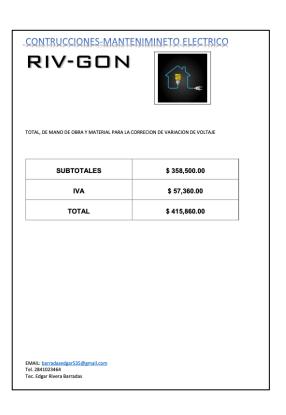

IREC	"SERVISION DE ELECTRIFICACION Y CONS COTIZACION RGE A. ROMANO GALINDO TOR, CRITS 77,MARCO ANTONIO MUROZ, OSE MARIA MARTIREZ, LEBOD O E TEADO, VERACRUZ	TRUCCIO	ON"				
RES	ENTE						
	dio del presente le envión un cordial saludo, al mismo tiempo pongo a su disposición ndo cubrir sus necesidades queda atento a sus comentarios u sugerencias.	la siguient	e cotización	solicitada,	de servicios	eléctricos	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	BI	costo	D/A	TOTAL
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A 1 TRANSFORMADORES DE 300 KVA TIPOPEDESTAL.	1	1	18,000.00	18,000.00	2,880.00	20,880.0
2	PRUEBAS DE REJACION DE TRANSFORMACION (TTR), ESTA PRUEBA DETERMINA, SI JAS SALIDAS DEL VOLTAJE DEL TRANSFORMACIOR SON CORRECTAS PARA SEGUIR JABORANDO	LOTE	1				
3	PRUEVAS DE RESISTENCIAS DE TERRAS RISICAS (TERROMETRO)ESTA PRUEBA CONSISTE EN CHECARLA RESISTENCIA ONNICA DEL TERRENO EN CASO DE ALGUNA DESCARGA COMOSFERICA O ALIGUN CORTO CIRCUITO	LOTE	1				
4	PRUEVA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN SUS ENBOBINADOS (MEGERI) ESTA PRUEBA CONSISTE EN CHECAR QUE LOS ENBOBINADOS NO TENGAN FUGAS DE CORRIENTE	LOTE	1				
- 5	DESCONEXION DE BOQUILLAS DE MEDIA TENSION	LOTE	1				
- 6	DESCONEXION DE BOQUILLAS DE BAJA TENSION	LOTE	1				
	REVISION DE BOQUILLAS DE BAIA Y MEDIA TENSION , ASI COMO REAPRIETAMIENTO DE TORNILLERIAPARA SU BUEN PUNCIONAMIENTO	LOTE	1				
- 8	REVISION DE NIVELES DE LIQUIDO AISLANTE (ACEITE DIELECTRICO)	1	LTS				
	RELLENADO DE LIQUIDO AISLANTE DE SER NECESARIO (EL ACEITE SE CAMBIA SI ES NECESARIOS DESPUES DE QUE EL LABORATORIO ENTREGUE LAS PRIJEBAS).	LOTE	1				
	PRUEBAS FISICO, QUIMICO Y ELECTRICO	LOTE	1	3,150.00	3,150.00	504.00	3,654.0
	PRUEBAS DE CROMATOGRAFIA. DE GASES	LOTE	1	3,680.00	3,680.00	588.80	4,268.8
12	UMPIEZA DE TRANSFORMADOR CON SOLVENTE DIELECTRICO	LOTE	1				
13	LAMADO DE TRANSFORMADOR, PRITADO DE COLOR GRIS, NICLUTE LAS HERMANIENGTAS INCESSARIAS, MUERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION. B.UTROS DE PRITURA GRIS B. RROCHAS 50 LITROS DE THINER	LOTE	1	11,400.00	11,400.00	1,824.00	13,224.0
	LUADO, PINTADO CON PINTURA EPOXICA DEL MISMO COLOR	LOTE	1		4,500,00	****	
14				4,500.00	4,500.00	720.00	5,220.0
	GESTION Y LIBRANZA ANTE CEE PARA SU RETIRO DE CARGA Y SU CORRECTA EJECUCION EN EQUIPOS	LOTE	1				

19	SI EL TRANSFORMADOR PRESENTA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASI COMO MATERIALES TENDRANQUE SER SOLVENTADOS POR EL USUSARIO CAMBIO DE EMPRAÇUE DE TRANSFORMADOR DE 300KVA REALIZANDO TRABAJOS DE RETIRO DEACEITE DE	LOTE	1				
	TRANSFORMADOR SE REALIZAN TRABAJOS EN CAMPO, EL CUAL INCLUYE LAS HERRAMIENTAS Y MAND DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. IMANTENIMIENTO A INTERRUPTORES SECUNDARIOS DE DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS. CONSISTE EN	LOTE	1	8,000.00	8,000.00	1,280.00	9,280
21	REACCIMODO Y REAPRIETE DE TORRILLERIA, LIMPIEZA DE TERMINALES Y SEPARACIÓN DE LAS MISMAS, INCLUYE LAS HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	12,000.00	12,000.00	1,920.00	13,920
22	IGENTIFICACIÓN DE LOS REGISTROS ELÉCTRICOS, PINTADO DE TAPAS COLORES 1900, BALANCEO DE CARGAS EN TRANSCRIMANDO DE 190 EVIA , INCLUTE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	10,000.00	10,000.00	1,600.00	11,600
	CAMBIO DE INTERRUPTOR PRINCIPAL MARCA CUORI NICLUYE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS YMANIO DE OBRA PARA SU CORRECTA DECUCION. 2 CINTAS DE SCOCH 33 3 CINTAS DE SCOCH 23	LOTE	1	39,800.00	39,800.00	6,368.00	46,168
23			_	115 730.00	115,730.00	18,516.80	134.266
	Sin más por al momento me despido de ustad enviándole un cordial saludo y que	uedando	atento a i	ina resnues	ta nositiva	dasu	
	Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo y q parte. Noto: Para la realización de los trabajos mencionados se sollicita el anticipo c se solicita el 50% restante, mencionando que la entrega del trabajo es de un	del 50% a	l inicio de	obra y al fi	inalizar el		
	parte. Nota: Para la realización de los trabajos mencionados se solicita el anticipo c	del 50% a	l inicio de	obra y al fi	inalizar el		

Cotización 3. Empresa a quien se asignó el mantenimiento

Evidencias del trabajo realizado





Centro de carga de 600 amp. nuevo



Revisión de centro de carga y break



Instalado nuevo Centro de carga





Medición de voltaje




Revisión de circuitos secundarios








Limpieza de transformador, cableado

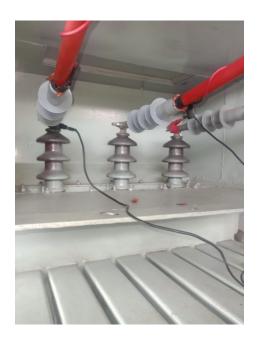

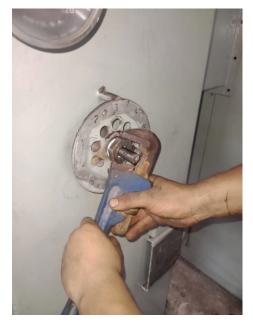

Mantenimiento a transformador



Equipo utilizado para medición de voltaje





Corte de energía



Limpieza y pintada de transformador



Identificación y señalización de registros

Gracias al liderazgo y gestión de Jorge Alfredo Romano Galindo, director del CBTis 77, y a la aportación de los padres de familia de los alumnos de nuevo ingreso, debido al buen trabajo colaborativo con el Comité Escolar de Administración Participativa del CBTIS 77, el CEAP cubrió la totalidad del mantenimiento correctivo a la subestación eléctrica, pagando a la empresa "Servicios de Electrificación y Construcción" \$140,250.80 (ciento cuarenta mil doscientos cincuenta pesos 80/100 M.N.), desde el 31 de julio de 2023, se normalizó el servicio eléctrico en el CBTis 77 y la secundaria.

El día 9 de agosto, se recibe la visita de los CC. Arq. Javier Hernández González e Ing. Julio Pérez Castañeda, del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), encargados de supervisar la infraestructura física en las escuelas. Durante su recorrido, señalaron que emitirán una recomendación acerca del servicio eléctrico del plantel.



Trabajo preliminar al arribo de INIFED al CBTis 77



Trayecto a la Subestación eléctrica



Recopilación de evidencias

